
N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	26/01/2016	26/01/2016	0
2	F1	Preparazione cantiere	27/01/2016	29/01/2016	2
3	F2	DEMOLIZIONI	30/01/2016	09/02/2016	10
4	F3	SCAVI per fondazioni	10/02/2016	14/02/2016	4
5	F4	FONDAZIONI	15/02/2016	20/02/2016	5
6	F5	ADEGUAMENTI ANTISISMICI E NUOVE STRUTTURE PORTANTI	21/02/2016	12/03/2016	20
7	F6	ADEGUAMENTO COPERTURA (LUCERNAI)	14/03/2016	18/03/2016	4
8	F7	DIVISORI INTERNI	19/03/2016	24/03/2016	5
9	F8	SCASSI E PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI A RETE	25/03/2016	06/04/2016	12
10	F9	SOTTOFONDI ED ISOLAMENTI INTERNI	07/04/2016	22/04/2016	15
11	F10	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	23/04/2016	05/05/2016	12
	F10.1		05/09/2016	07/09/2016	2
12	F11	IMPIANTO ELETTRICO, DATI, LUCE E RILEVAZIONE INCENDI	23/04/2016	01/05/2016	8
	F11.1		01/07/2016	05/07/2016	4
	F11.2		17/08/2016	02/09/2016	16
	F11.3		15/10/2016	24/10/2016	9
13	F12	IMPIANTO IDRICO/SANITARIO	06/05/2016	16/05/2016	10
	F12.1		25/09/2016	02/10/2016	7
14	F13	IMPIANTO TERMICO/RAFFRESCAMENTO	07/05/2016	01/06/2016	25
	F13.1		28/09/2016	06/10/2016	8
15	F14	IMPIANTO GAS	02/06/2016	05/06/2016	3
16	F15	MASSETTO	06/06/2016	08/06/2016	2
17	F16	INTONACI INTERNI	09/06/2016	30/06/2016	21
18	F17	RIVESTIMENTO PARETI	06/07/2016	26/07/2016	20
19	F18	CONTROSOFFITTI	27/07/2016	16/08/2016	20
20	F19	SERRAMENTI ESTERNI	12/08/2016	28/08/2016	16
21	F20	PAVIMENTI INTERNI	03/09/2016	24/09/2016	21
22	F21	FINITURE INTERNE	25/09/2016	07/10/2016	12
23	F22	SERRAMENTI INTERNI	08/10/2016	14/10/2016	6
24	F23	SCAVI ESTERNI PER IMPIANTI TECNOLOGICI	01/09/2016	03/09/2016	2
25	F24	POSA LINEE A RETE ESTERNE ED ALLACCIAMENTI	04/09/2016	07/09/2016	3
26	F25	COLLAUDO IMPIANTI	25/10/2016	02/11/2016	8
27	F26	FINITURE E SISTEMAZIONI ESTERNE	03/11/2016	23/11/2016	20
28	F27	SMOBILIZZO CANTIERE	24/11/2016	26/11/2016	2
29	F28	PULIZIA E FINE LAVORI	27/11/2016	30/11/2016	3

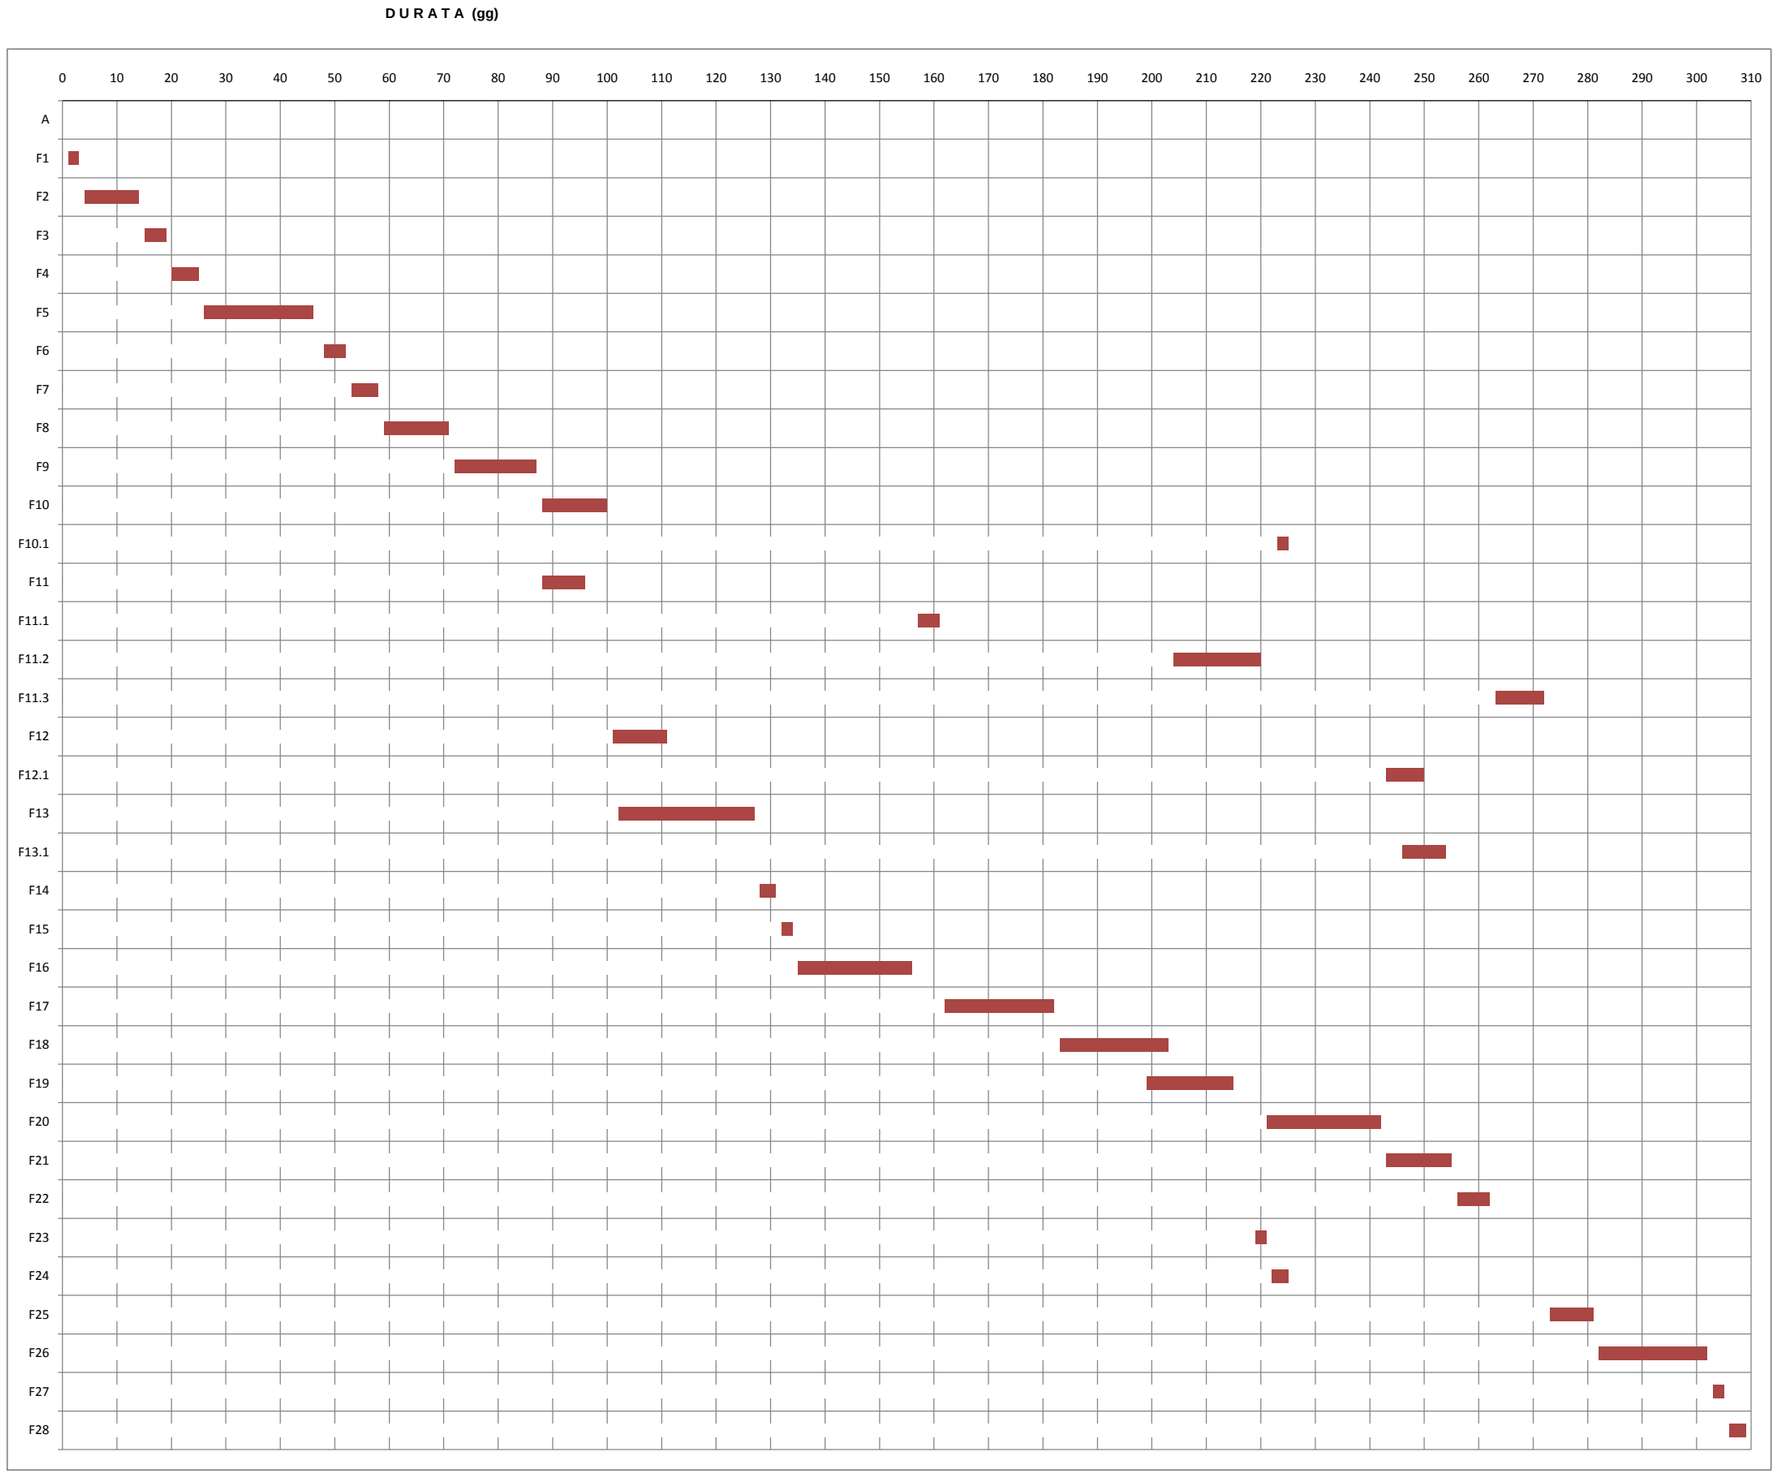

Inizio dei lavori

0 gg

Fine lavori

309 gg

TC **309** gg.

naturali consecutivi
